

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 116 Del 29/07/96

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Vincenzo Natta)



Km 38+575

CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE


PROVINCIA DI VENEZIA

PROGETTO PRELIMINARE DI OPERE DI VIABILITA' CONNESSE
ALLA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO

PROGETTAZIONE OPERE :

Ing. RENATO VITALIANI

dello Studio Tecnico Associato Ing. Filippo Navarra e Ing. Renato Vitaliani
via Milazzo, 10bis - 35139 Padova -
tel. 049/8724244 - fax 049/8724247




DATA	PROGETTO E MODIFICHE		
07/07/1996			
OGGETTO	ALL. D		
INDAGINE GEOGNOSTICA			

STUDIO NAVARRA VITALIANI
S. DONA' DIPIAVE (VE) PLANIMETRIA GENERALE

- SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
- PROVE PENETROMETRICHE STATICHE





Gruppo Maffei

geosondaggi s.r.l. via Europa 34 ESTE (PD) t. 0429/3617 - 3417


COMMITTENTE STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE S. DONA' DI PIAVE (VE)

PROVA C.P.T. N° 2

QUOTA P.C.

DATA 08/07/96

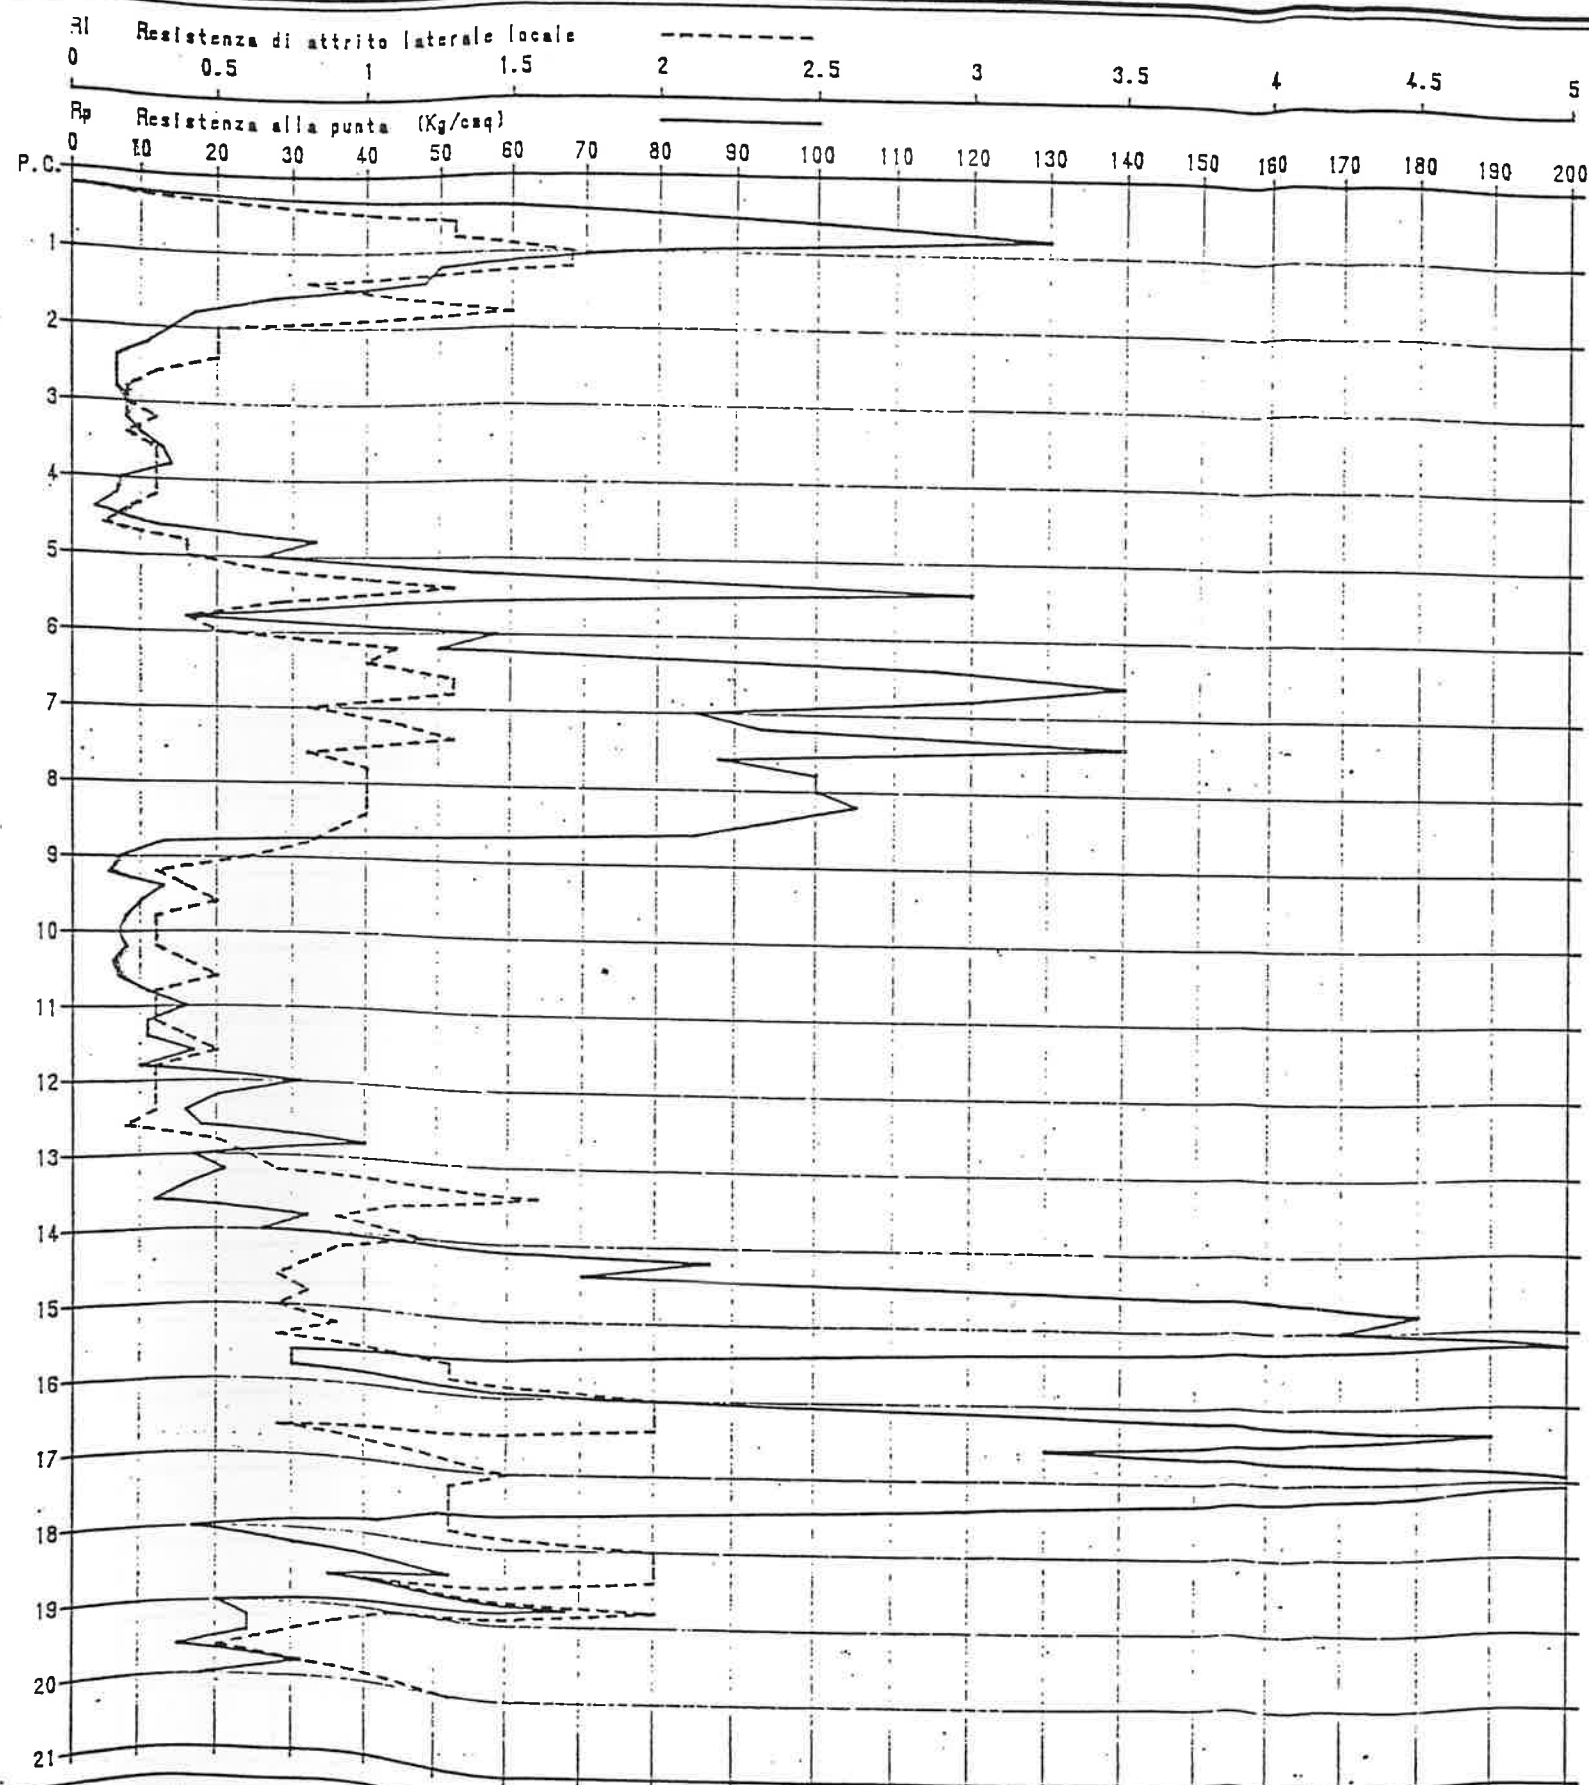

Pr	Rp	RI	$\frac{Rp}{RI}$
0.2	0	0.01	10
0.4	60	0.70	86
0.6	100	1.30	77
0.8	130	1.30	100
1.0	75	1.70	44
1.2	50	1.70	29
1.4	48	0.80	60
1.6	27	1.10	25
1.8	17	1.50	11
2.0	14	0.50	28
2.2	11	0.50	22
2.4	6	0.50	12
2.6	6	0.30	20
2.8	6	0.20	30
3.0	8	0.20	40
3.2	8	0.30	27
3.4	10	0.20	50
3.6	13	0.30	43
3.8	14	0.30	47
4.0	7	0.30	23
4.2	6	0.30	20
4.4	3	0.20	15
4.6	12	0.10	120
4.8	33	0.40	83
5.0	26	0.40	65
5.2	55	0.70	79
5.4	120	1.30	92
5.6	45	0.70	64
5.8	18	0.40	40
6.0	58	0.50	116
6.2	50	1.10	45
6.4	115	1.00	115
6.6	140	1.30	108
6.8	120	1.30	92
7.0	85	0.80	106
7.2	93	1.10	85
7.4	140	1.30	108
7.6	88	0.80	110
7.8	100	1.00	100
8.0	100	1.00	100
8.2	105	1.00	105
8.4	95	1.00	95
8.6	85	0.90	94
8.8	13	0.80	16
9.0	7	0.60	12
9.2	5	0.30	17
9.4	13	0.40	33
9.6	10	0.50	20
9.8	8	0.30	27
10.0	7	0.30	23
10.2	8	0.30	27
10.4	6	0.40	15
10.6	7	0.50	14
10.8	11	0.30	37
11.0	16	0.30	53
11.2	11	0.30	37
11.4	11	0.40	28
11.6	17	0.50	34
11.8	10	0.30	33
12.0	31	0.30	103

Pr	Rp	RI	$\frac{Rp}{RI}$
12.2	20	0.30	67
12.4	16	0.30	53
12.6	18	0.20	90
12.8	40	0.50	80
13.0	17	0.60	28
13.2	21	0.70	30
13.4	16	1.60	10
13.6	12	1.10	11
13.8	32	0.90	36
14.0	26	1.20	22
14.2	87	0.90	97
14.4	70	0.80	88
14.6	180	0.70	229
14.8	180	0.80	225
15.0	170	0.70	243
15.2	200	0.90	222
15.4	100	0.70	143
15.6	30	1.30	23
15.8	30	1.30	23
16.0	72	2.00	36
16.2	150	2.00	75
16.4	190	2.00	95
16.6	130	0.70	188
16.8	180	1.20	150
17.0	210	1.50	140
17.2	180	1.30	138
17.4	120	1.30	92
17.6	50	1.30	38
17.8	42	1.30	32
18.0	17	2.00	9
18.2	30	2.00	15
18.4	52	2.00	26
18.6	35	1.00	35
18.8	88	2.00	34
19.0	20	1.10	18
19.2	24	0.90	27
19.4	24	0.70	34
19.6	15	0.50	30
19.8	31	0.80	39
20.0	18	1.30	14


Gruppo Maffei

geosondaggi s.r.l. via europa 34 E S T E (PD) t. 0429/3617 - 3417

COMMITTENTE STUDIO NAVARRA VITALIANI - **CANTIERE** S. DONA' DI PIAVE (VE)

PROVA C.P.T. N° 2

QUOTA - 20.00 . DATA 08/07/96

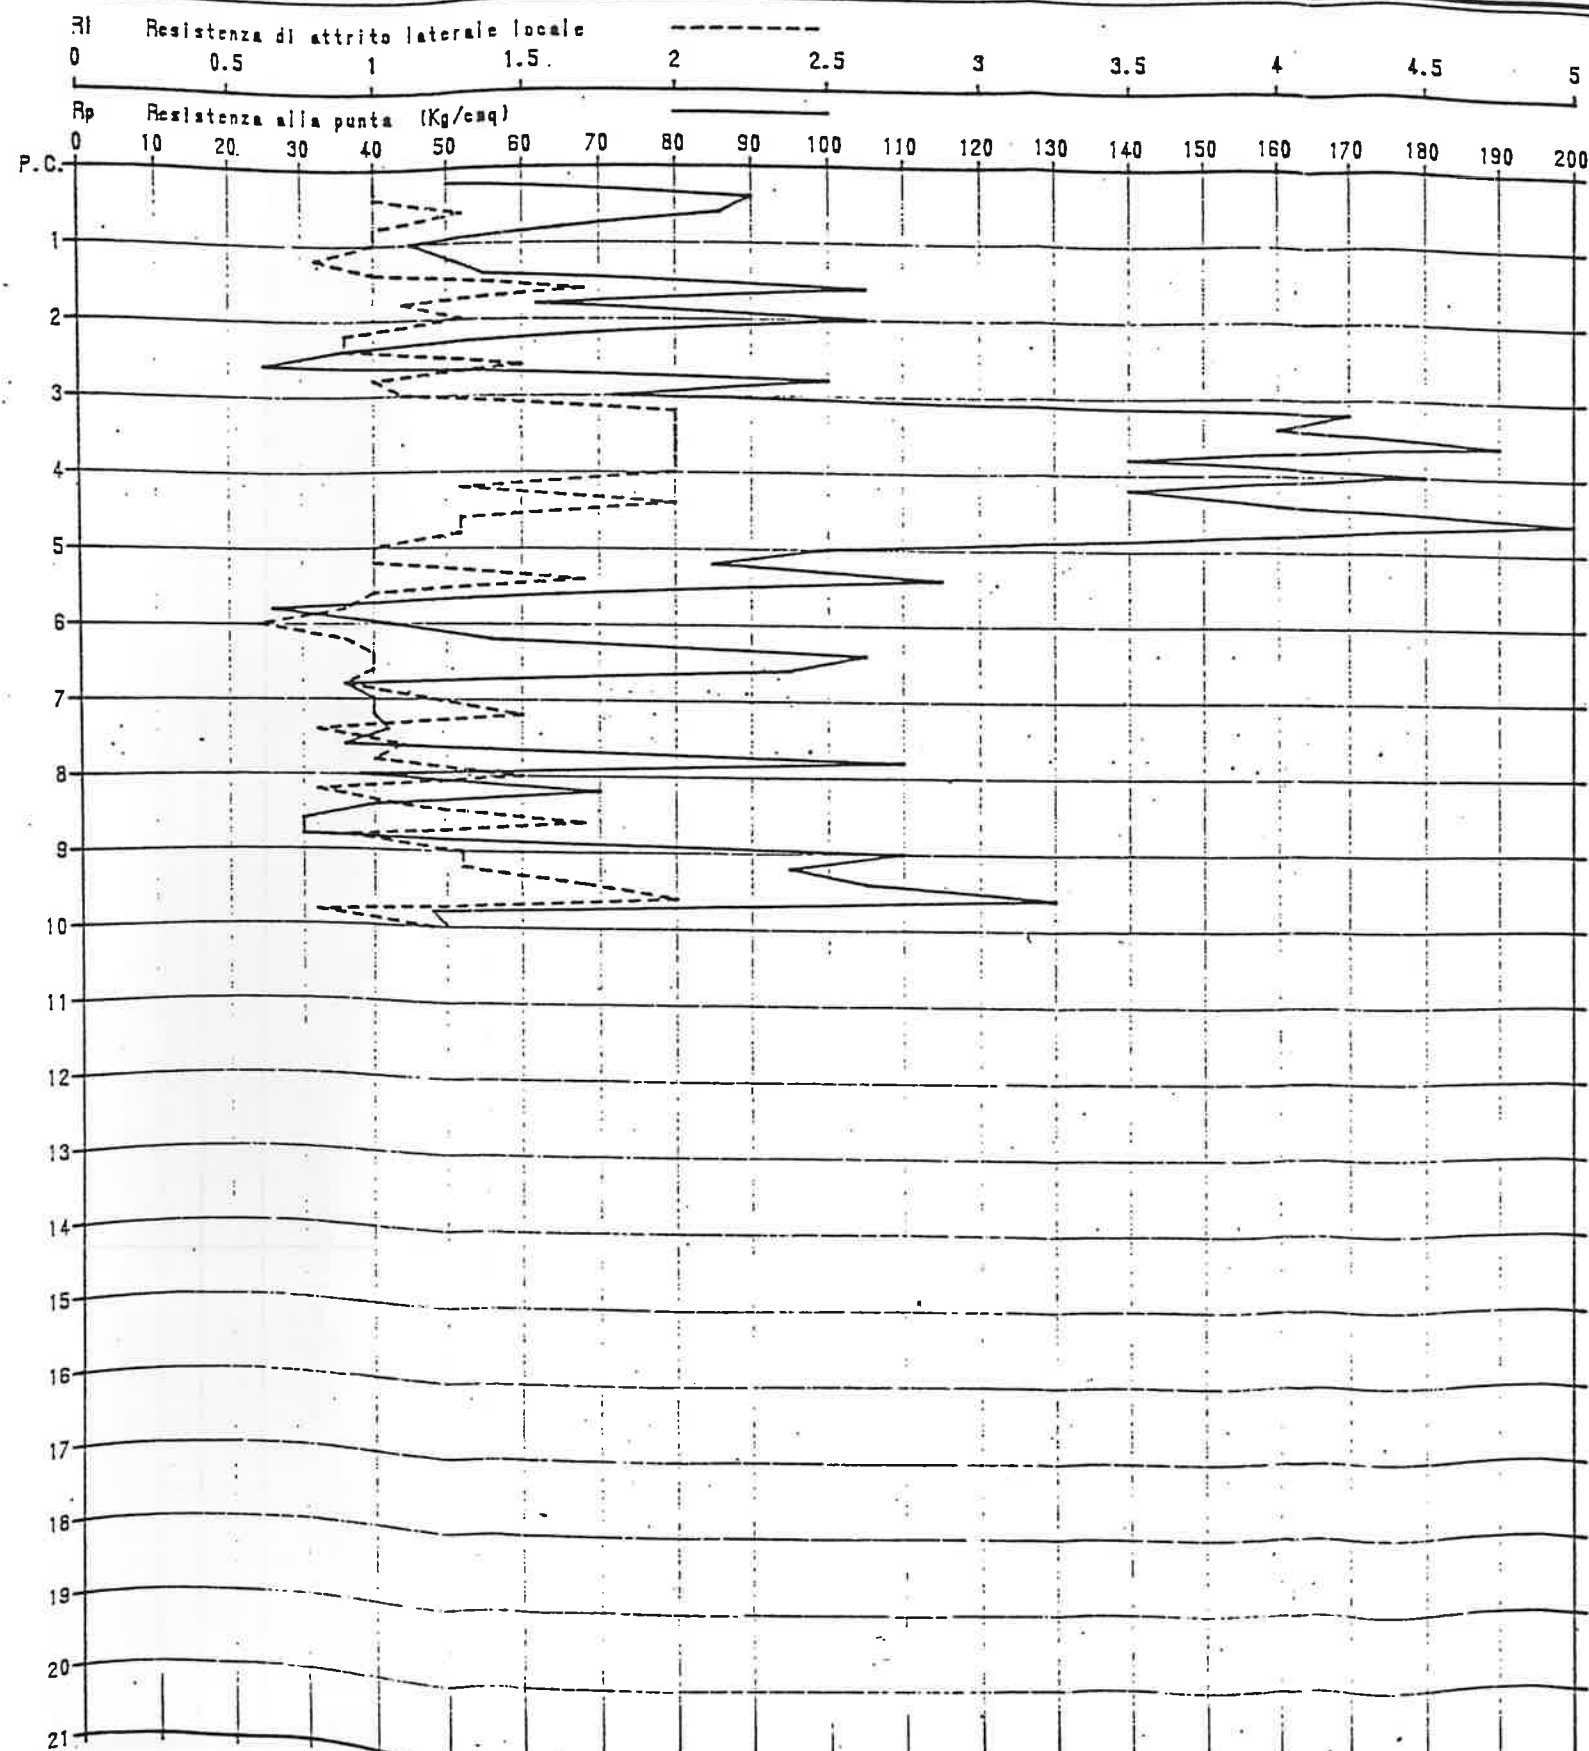

Pr.	R _p	RI	$\frac{R_p}{RI}$
0.2	50	1.00	50
0.4	90	1.00	90
0.6	86	1.30	66
0.8	65	1.00	65
1.0	45	1.00	45
1.2	50	0.80	63
1.4	55	1.00	55
1.6	105	1.70	62
1.8	62	1.10	56
2.0	105	1.30	81
2.2	68	0.90	73
2.4	36	0.90	40
2.6	25	1.50	17
2.8	100	1.00	100
3.0	72	1.10	65
3.2	170	2.00	85
3.4	160	2.00	80
3.6	190	2.00	95
3.8	140	2.00	70
4.0	180	2.00	90
4.2	140	1.30	102
4.4	160	2.00	80
4.6	200	1.30	154
4.8	160	1.30	123
5.0	100	1.00	100
5.2	85	1.00	85
5.4	115	1.70	68
5.6	65	1.00	65
5.8	26	0.90	23
6.0	42	0.60	70
6.2	56	0.90	62
6.4	105	1.00	105
6.6	95	1.00	95
6.8	36	0.90	40
7.0	40	1.20	33
7.2	40	1.50	27
7.4	42	0.80	53
7.6	36	1.10	33
7.8	110	1.00	110
8.0	38	1.50	25
8.2	70	0.80	88
8.4	40	1.10	36
8.6	30	1.70	18
8.8	30	0.90	33
9.0	110	1.30	85
9.2	95	1.30	73
9.4	105	1.70	62
9.6	130	2.00	35
9.8	48	0.80	60
10.0	50	1.20	42

[illegible]
